

[01_01]九州大学大型計算機センター広報 : 1(1)

<https://doi.org/10.15017/4843154>

出版情報 : 九州大学大型計算機センター広報. 1 (1), pp.1-68, 1968-04. 九州大学大型計算機センター
バージョン :
権利関係 :



建 築 小 委 員 会 報 告

建築小委員会は九州大学大型計算機センターの建物に関する調査、審議を行なうことを目的に設置され、昭和42年4月以降後述の経過報告にある通りの日程で、建築計画の検討、国内の既設センターの調査、メーカーとの打合せ等を行ないました。建築工事は昭和43年1月に着工され、同年8月末完了の予定です。建物は6階建延3576.15 平方メートルで1階～5階は九州大学大型計算機センター、6階は既設の九州大学中央計数施設として設計されています。

各階の主な用途は次の通りです。




- | | |
|-----|---------------------------|
| 1 階 | 空調機械、電源、倉庫 |
| 2 階 | 一般ジョブ窓口、ロビー、オープンパンチ室、入出力室 |
| 3 階 | 計 算 機 室 |
| 4 階 | パンチ室、プログラム相談室、研究開発部 |
| 5 階 | 事務、管理部、出張利用者滞在室 |




なお、経過報告、建築位置図、平面図、完成予想図、利用者との関連図は下記の通りです。


経 過 報 告

4月18日	第1回小委員会	基本計画の検討
4月28日	調 査	計算センター調査（九州電力株式会社、福岡銀行）
5月 1日	第2回小委員会	設計図面の検討
5月22日	第3 “	人員機構、情報の流れ、物の流れと設計図面の検討
7月 5日	第4 “	平面図検討
9月26日	第5 “	平面図検討
10月 9日	第6 “	平面図決定
11月24日	第7 “	電気、設備関係の検討
12月 7日	調 査	計算機室仕上調査（東洋工業、広島鉄道局その他）
1月12日	調 査	電源関係調査（気象庁その他）
1月22日	調 査	計算機室内装材（東海銀行名鉄本社その他）
2月 7日	第8回小委員会	最終図面検討承認

九州大学大型計算機センター平面図

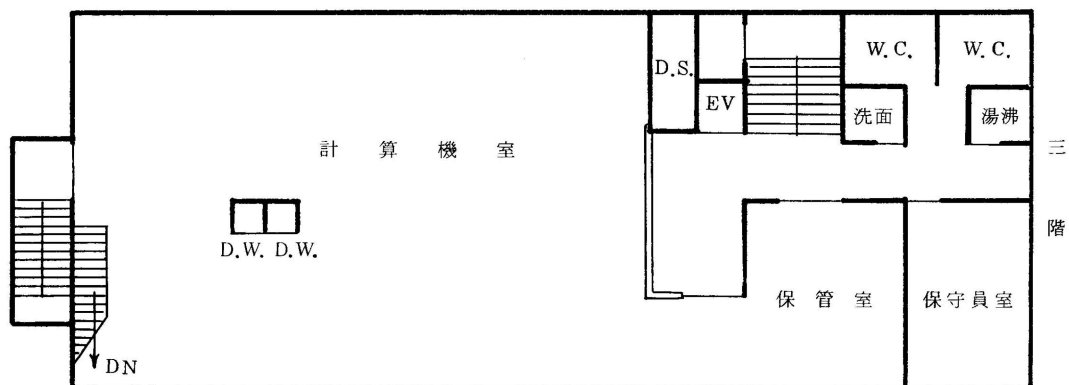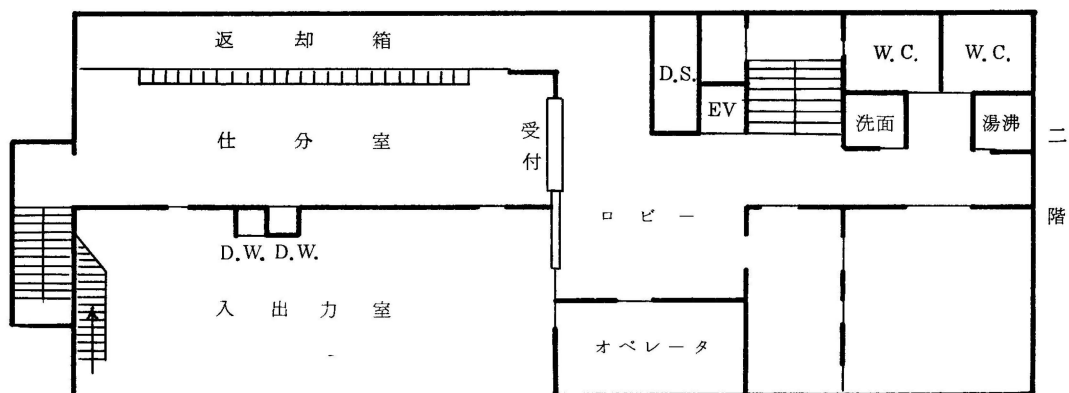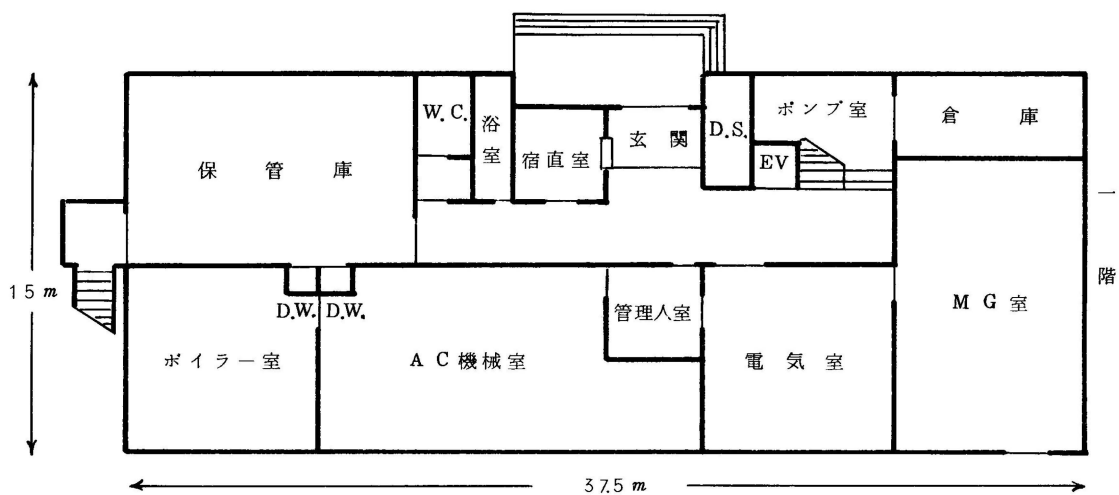

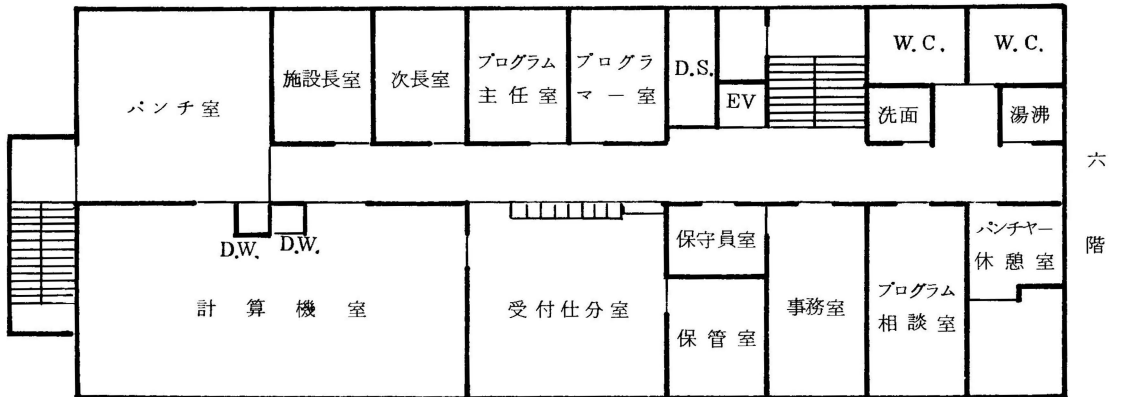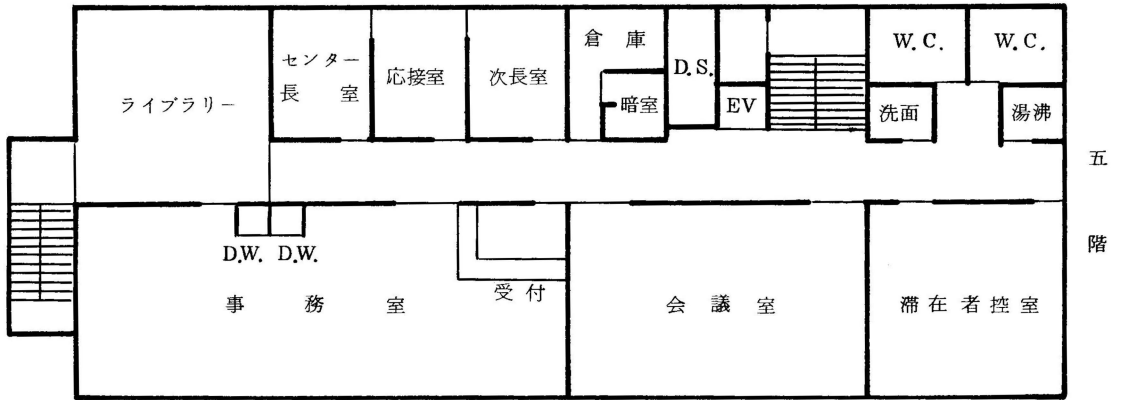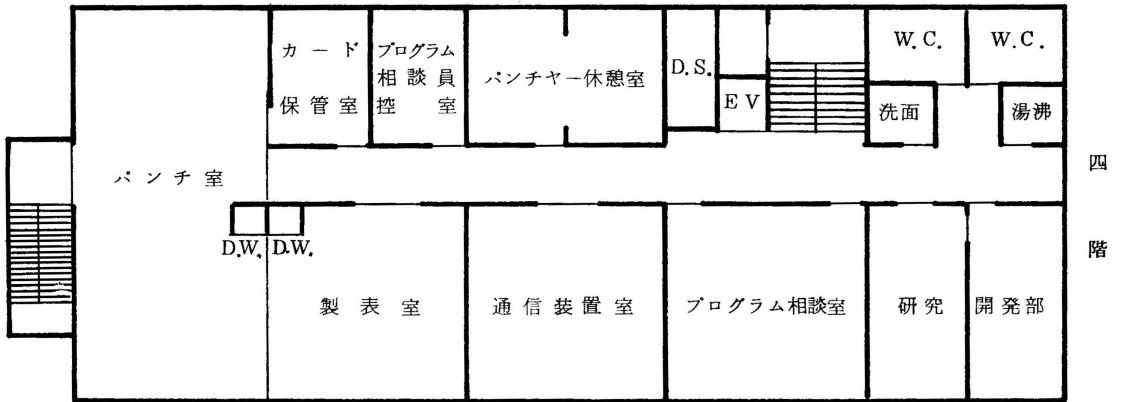

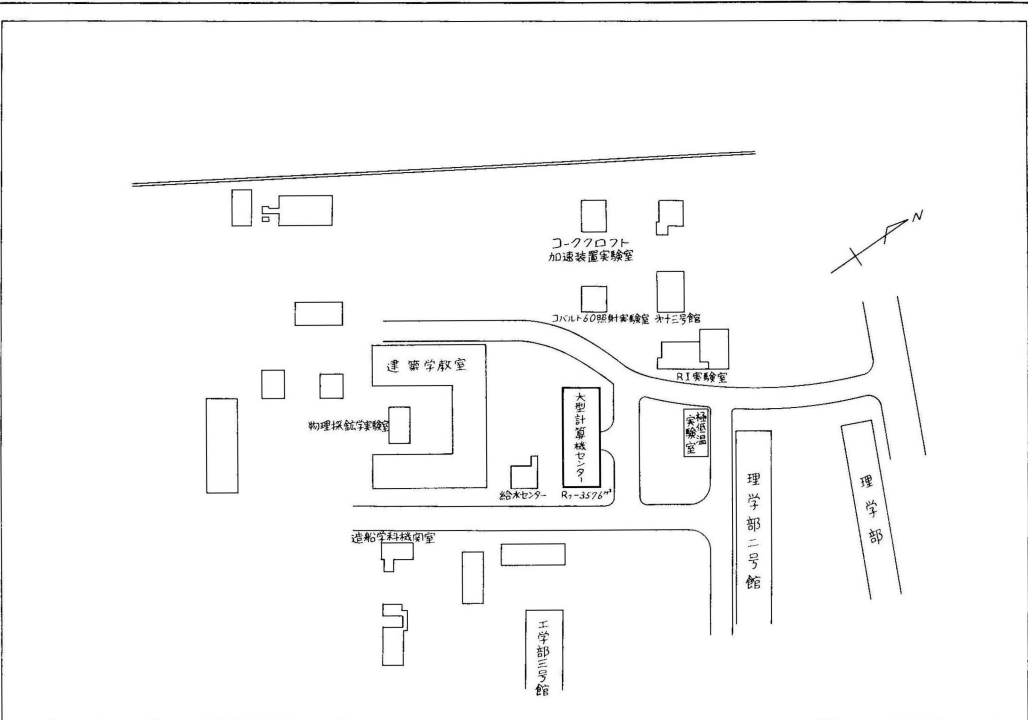

九州大学大型計算機センター位置図



九州大学大型計算機センター完成予想図

九州大学大型計算機センターの仕事の流れ

